

Upprustning av Skånsta lekplats

Sammanfattning av arbeten genomfört under V48

Under veckan som gått har vi riggat stolpar för det blivande staketet.

Betongstensfrisen är till stora delar monterad. Vi har även kommit igång med sättning marktegel i Jordfuktad betong. Vi har gjutit staketstolpar och den stora parkourutrustningen.

De stora stolparna med armaturer är monterade och ska justeras tillsammans med ljusexpert nästa vecka.


I slutet av veckan har vi fortsatt med marktegelsättning och stensättning.



Rigging av stolpar. Det är impregnerade virke i stommen. Senare kläs staketet med en stående panel av målat obehandlat virke.



Mycket leveranser med utrustning börjar dyka upp. I bakgrunden syns betongbilen.

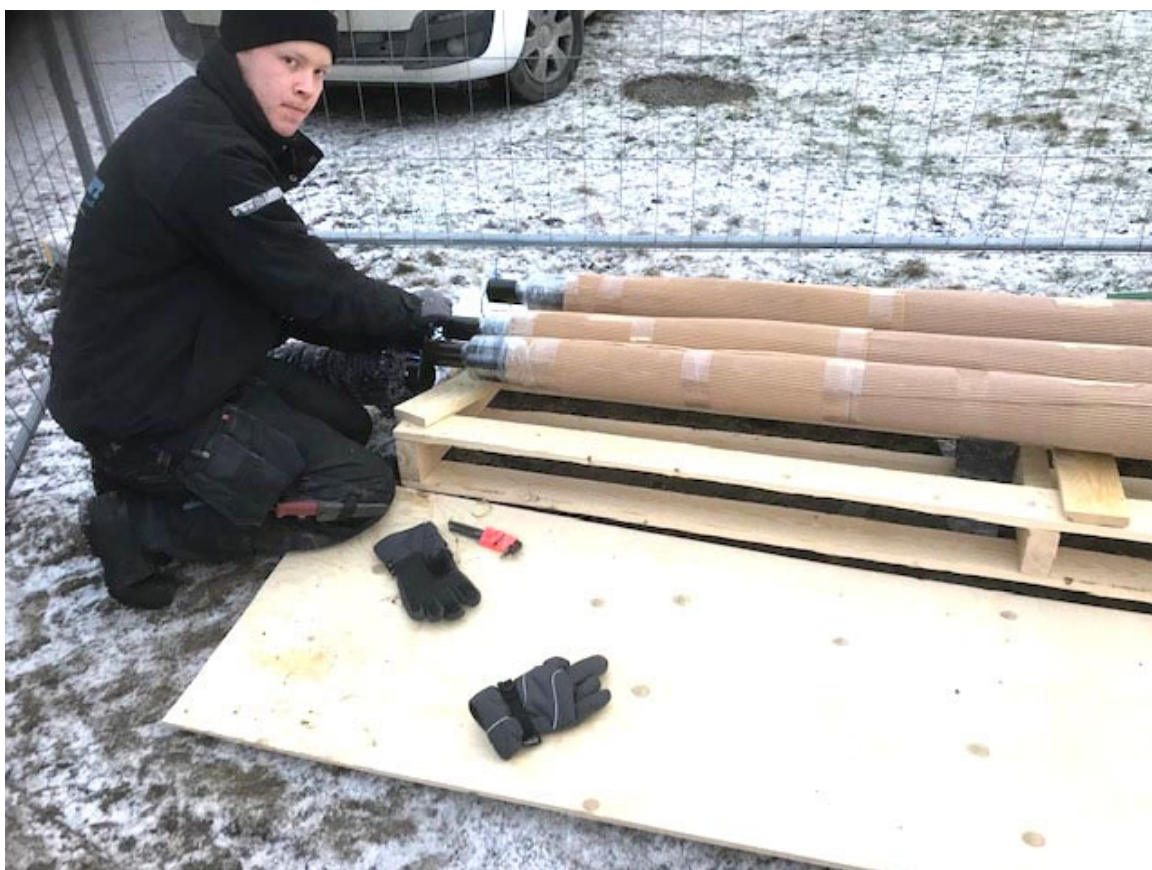

Montering av armaturer på stolpar inför lyft på plats fredag.



Parkouren efter gjutning. I nederkant syns också start med markstensläggning.





Högstolpar sätts på plats redan nu.

