

Byggnation Kråkbergsparken

Sammanfattning av arbeten genomfört under V24

Nu har den mesta utrustningen på balansbanan monterats och gjutits, återstår en däcksgång som kommer monteras när vi är klara uppe på berget och kan ta bort den tillfälliga byggvägen som går upp vid linbanan.



Runtom i parken har vi färdigställt ytor där vi i nästa vecka ska bygga upp olika växtbäddar för buskar, perenner och träd. En del växtbäddar för gräsytor har vi redan börjat med.




Lite mer kubbsarg sattes upp i veckan som ska hålla isär en planteringsyta och konstgräsyta utanför gungställningen.



Inne på den stora planen fortsatte arbetet med att justera bärlager för asfalt och konstgräs.

En lite kulle växte fram på platsen där konstverket kommer placeras efter sommaren.

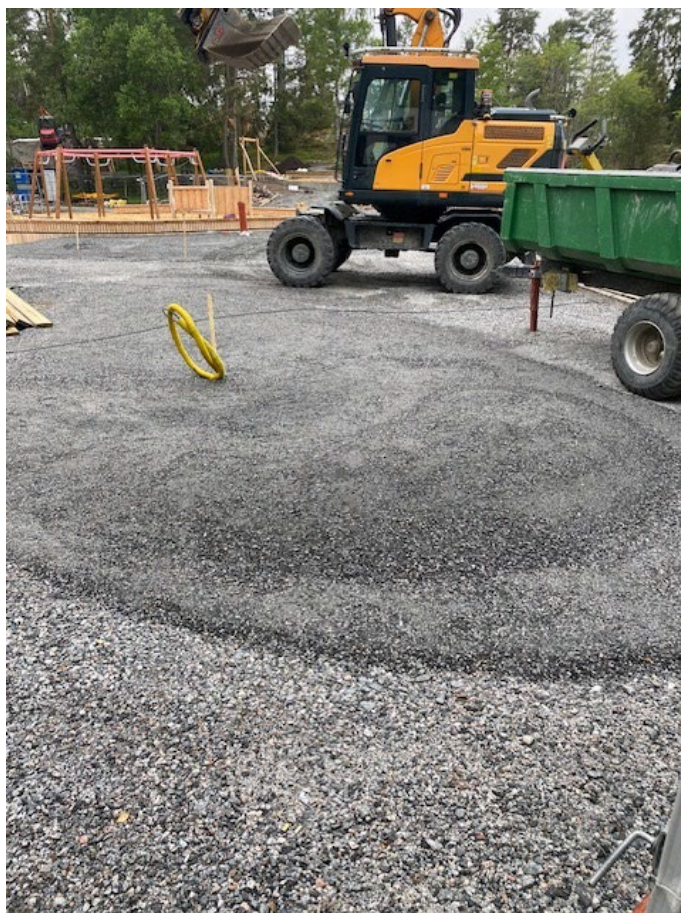



Utmed ålderdomshemmets fasad bygger vi en skiljevägg i trä så inte den fuktiga planteringsjorden ligger mot huset.
