

Upprustning av Skånsta lekplats

Sammanfattning av arbeten genomfört under V45

Under veckan som gått har vi filat på snigelkullen och satt ut plint rör för utrustning. Vi har också planerat, packat och justerat material. Löken som ska sitta i gräsytor förbeställdes och planterades ut i veckan. Detta för att slippa gå in och gräva sönder gräset för lökplantering nästa höst.



Här syns ett virrvarr med plintrör. Den nedre linjen är gjutrör för det blivande staketet.



En av lökplanteringarna. Strösslad med sand.




Marktegelfris i hörna mot befintlig lönn.



Ovan syns marktegelfrisen som skiljer av mellan gräsmatta och blivande gummiyta. Inspänd i Jordfuktad betong.



Här syns annan bild från snigelkullen. Det ljusa som syns är sand som vi återanvänt från den tidigare leksandlådan, i ett runt lager på jorden. Det blir perfekt underlag för den kommande grästurfsläggningen.

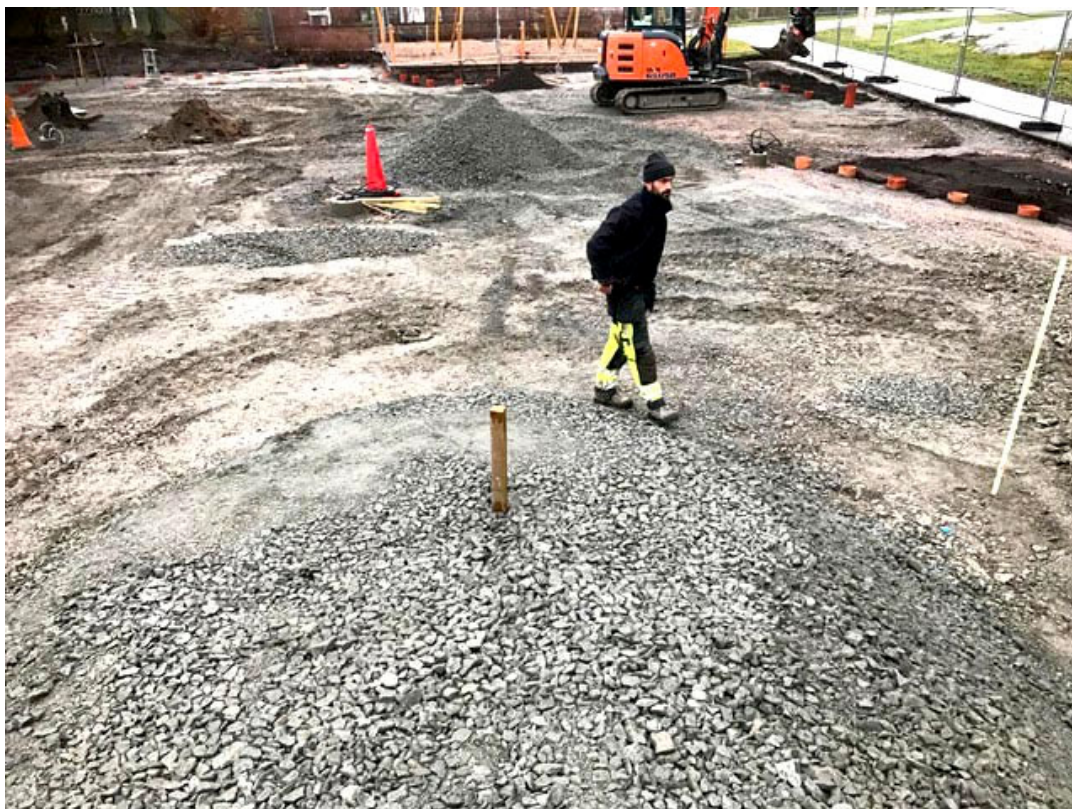

Här syns en bild från snigelkullen ner mot lekplatsen. Framför mina fötter ska 2 st robinia stockar målade och designade som känselspröt monteras så småningom.



Vi valde att sätta plint rör också för det blivande inspringskyddet mot planteringarna.



Ovan syns plint rör för pergolan som ska sitta som avgränsning mot släntplanteringen.
