

Datum: 2022-05-06

Slussholmen


Vecka 18

Efter en vårvinter med en hel del nederbörd och mycket vatten börjar det nu närma sig mer normala nivåer vid Slussholmen. I nästa vecka kommer sponten att tas bort och redan nu passerar vattnet genom det nya dämmet.

Betonggjutningarna är helt klara och alla stålkonstruktioner på plats men fortfarande kvarstår en hel del arbete med gångbroar, trädäck och bryggor.

Under april har en tillfällig fiskvandringsled varit öppen genom slusskanalen men nu när vattnet släpps på genom dämmet kan vi även öppna den permanenta fiskvandringsleden.



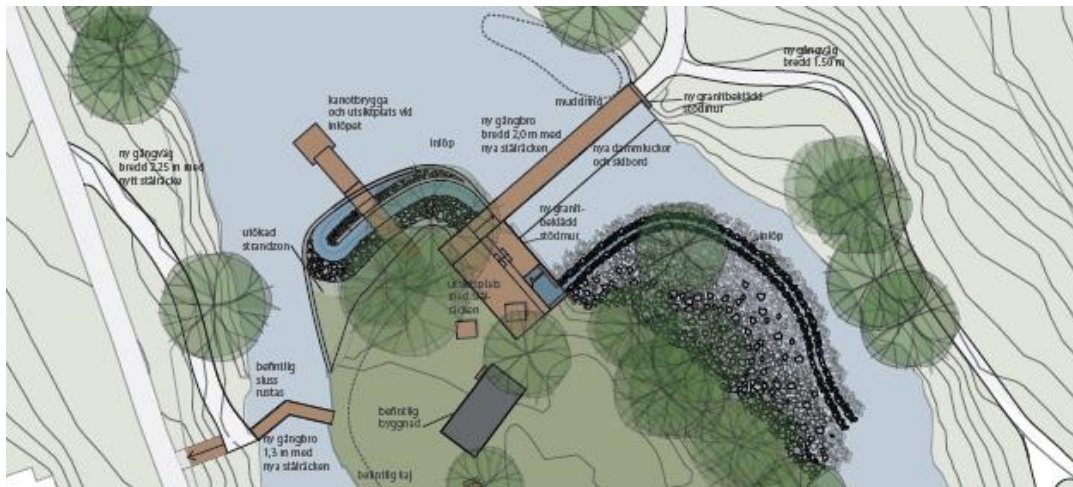

Efter att sponten är helt borta kommer slusskanalen stängas av och tömmas på vatten. Botten kommer att rensas och stensättningen fogas.

I augusti kommer slussportarna åter vara på plats och arbete med att passa in trädetaljer utförs.
