


Byggnation Kråkbergsparken

Sammanfattning av arbeten genomfört under V40

I parken börjar nu alla planteringar ta form, först ut är det dom större träden och buskarna som planteras. Efter det kommer vi plantera mindre buskar, perenner och tusentals med lökar som kommer ge härlig färg åt planteringarna till våren.

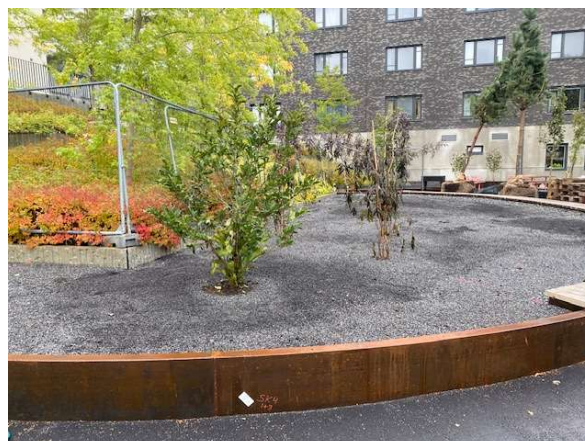

Som bilden ovan visar, jorden på planteringsytorna ser inte ut som vanligt. Jorden är svart på grund a av den innehåller biokol:

Krav på material

Biokolen ska vara grundgödslad med 50 kg organiskt gödsel NPK5-1-4 per kubikmeter biokol alternativt 5 kg NPK 5-1-4 med mikronäringsämnen per kubikmeter biokol. Organisk gödsel ska vara hygieniserad. Komposten ska vara väl humifierad.

Kartan nedan belyser planteringsytorna



Växtbädd för nytt träd i planteringsyta

Makadam 2/6 med 25 % volym blandning av 1 del näringsberikad biokol och en del kompost 150 mm.

Avjämningslager 8/11 50 mm.

Luftigt bärlager 150 mm.

Kolmakadam 650 mm.

Biokol ogödslad 50 mm.

Luckring av terrass 200 mm

Växtbädd för perenner, lökväxter och buskar, PL1 och PL2

Utförs enligt L-31.2-01.

550 mm makadam 2/6 mm med 25 volym% blandning av 1 del näringsberikad biokol och 1 del kompost.

50 mm biokol ogödslad.

Luckring av terrass 200 mm.

Efter plantering vattnas växterna två gånger med två dagars mellanrum. Träd ska vattnas med minst 50 l/ träd per vattning.

Linjemålaren har varit på plats, men det blev inga linjer målade denna gången utan färgglada cirklar som bryter av allt det svarta och vita fält som markerar parkens entréer.





YTSKIKT

A	BEFINTLIG ASFALT. TVÄTTAS ERFÖDERLIGT DÄR ASFALTSMÅLNING UTFÖRS
A1	NY ASFALT, INGEN ASFALTSMÅLNING UTFÖRS
A2	ASFALTSMÅLNING, KULÖR VIT
A3	ASFALTSMÅLNING, KULÖR RAL 6019
A4	ASFALTSMÅLNING, KULÖR RAL 3014
A5	ASFALTSMÅLNING, KULÖR RAL 6002

I slänten upp mot berget jobbar smeden för fullt med att montera handledare utmed stigen och ett räcke vid linbanan.



